Modernizace silnice II323 Břehy–Rohovládova Bělá

SKANSKA
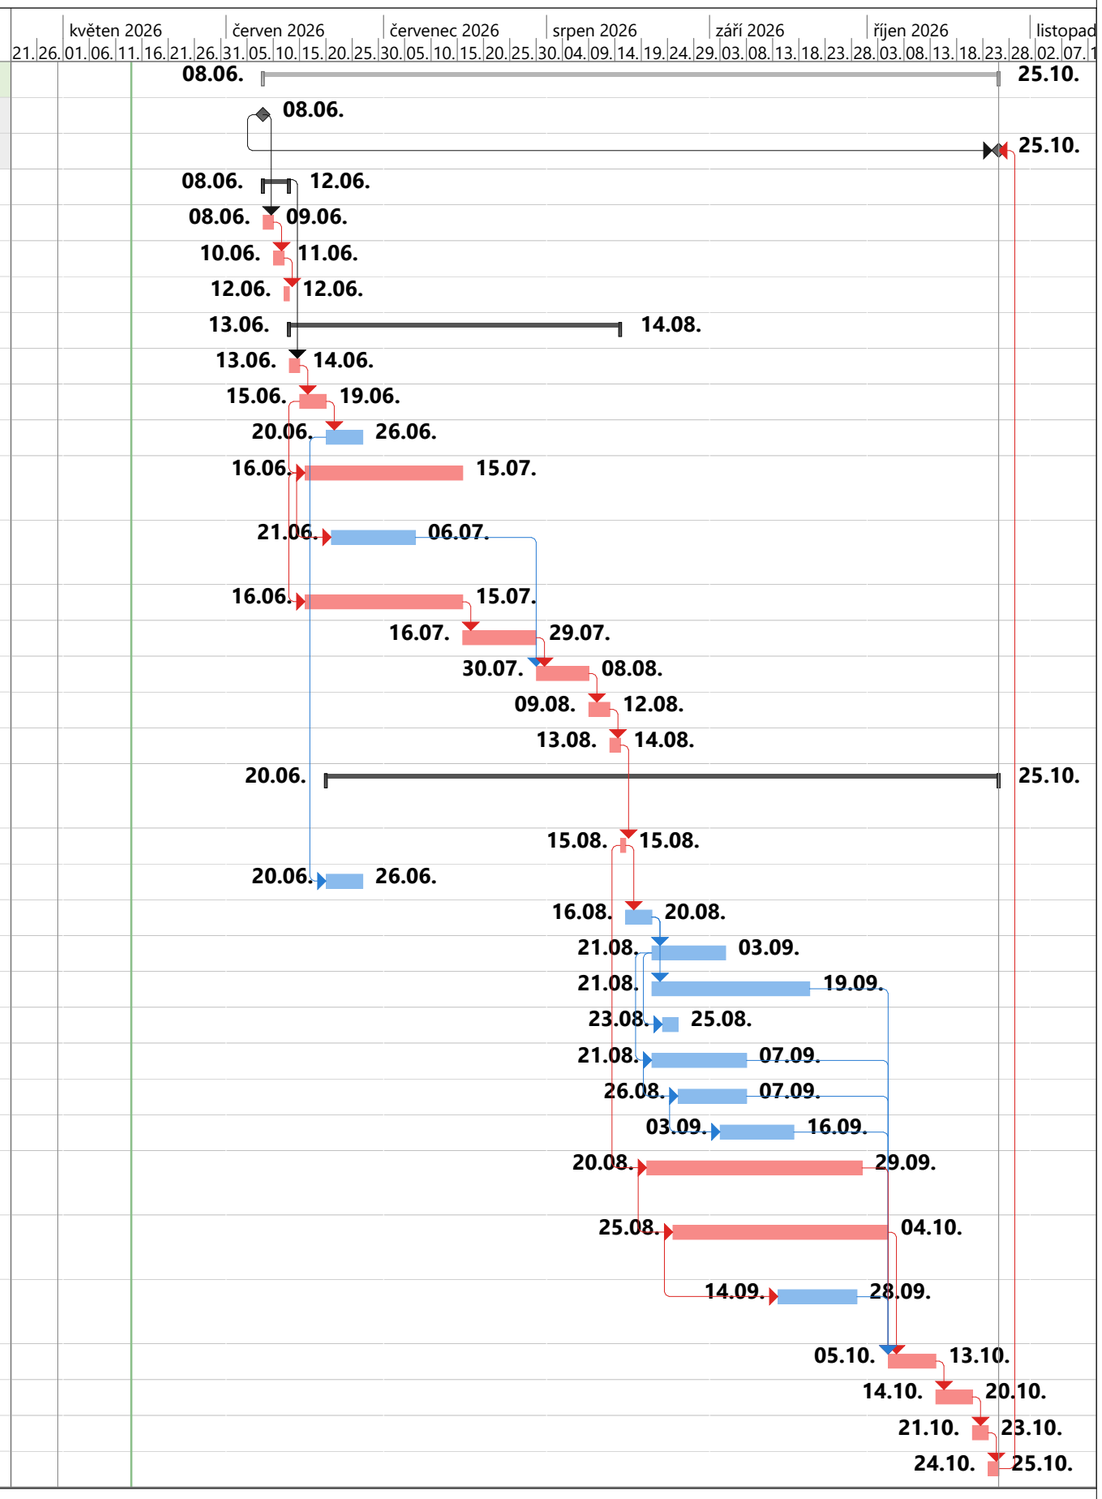
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		**Modernizace silnice II323 Břehy–Rohovládova Bělá**	**140 dny**	**08.06. 26**	**25.10. 26**
1		Zahájení stavby	0 dny	08.06. 26	08.06. 26
2		Dokončení stavby	0 dny	25.10. 26	25.10. 26
3		**Objízdné trasy**	**5 dny**	**08.06. 26**	**12.06. 26**
4		frézování	2 dny	08.06. 26	09.06. 26
5		pokládka asf. vrstev ACO 11+	2 dny	10.06. 26	11.06. 26
6		pokládka krajnic	1 den	12.06. 26	12.06. 26
7		**1.1 etapa Břehy - Vlčí Habřina km 0,030 - 3,280**	**63 dny**	**13.06. 26**	**14.08. 26**
8		uzávěra silnice, vyznačení objízdných tras	2 dny	13.06. 26	14.06. 26
9		frézování	5 dny	15.06. 26	19.06. 26
10		kácení TP (ovocné stromy, lesní porost…)	7 dny	20.06. 26	26.06. 26
11		zemní práce (skrývka krajnice, rozšíření krajnice a příkopů, vytěžení pařezů po kácení TP)	30 dny	16.06. 26	15.07. 26
12		sanace a rozšíření podkladních vrstev v dotčeném rozsahu podle diagnostiky resp. zjištěných potřeb	16 dny	21.06. 26	06.07. 26
13		propustky, sjezdy ze silnice	30 dny	16.06. 26	15.07. 26
14		recyklace	14 dny	16.07. 26	29.07. 26
15		pokládka asf. vstev ACP a ACO	10 dny	30.07. 26	08.08. 26
16		krajnice	4 dny	09.08. 26	12.08. 26
17		dopravní značení	2 dny	13.08. 26	14.08. 26
18		**2.1 etapa Vlčí Habřina - začátek obce Rohovládová Bělá km 3,280 - 5,389**	**128 dny**	**20.06. 26**	**25.10. 26**
19		uzávěra silnice, vyznačení objízdných tras	1 den	15.08. 26	15.08. 26
20		kácení TP	7 dny	20.06. 26	26.06. 26
21		frézování	5 dny	16.08. 26	20.08. 26
22		zemní práce (skrývka krajnice, rozšíření krajnice a příkopů)	14 dny	21.08. 26	03.09. 26
23		propustky, sjezdy ze silnice	30 dny	21.08. 26	19.09. 26
24		odvodnění hrany vozovky (drenáže)	3 dny	23.08. 26	25.08. 26
25		gabionová zeď	18 dny	21.08. 26	07.09. 26
26		veřejné osvětlení Vlčí Habřina	13 dny	26.08. 26	07.09. 26
27		chodník Vlčí Habřina, zastávkové zálivy	14 dny	03.09. 26	16.09. 26
28		kanalizace v obci Rohovládová Bělá, výměna kanalizace DL. 64 m + 38 m	41 dny	20.08. 26	29.09. 26
29		oprava chodníku po kanalizaci, sjezdy k nemovitostem, obrubníky s přídlažbou, propustek	41 dny	25.08. 26	04.10. 26
30		sanace podkladních vrstev vozovky v intravilánu Rohovládová Bělá	15 dny	14.09. 26	28.09. 26
31		recyklace	9 dny	05.10. 26	13.10. 26
32		pokládka asf. vrstev ACP, ACL a ACO	7 dny	14.10. 26	20.10. 26
33		krajnice, montáž svodidel, zábradlí	3 dny	21.10. 26	23.10. 26
34		dopravní značení	2 dny	24.10. 26	25.10. 26
